


Relatório Atividades PGD 26/06/2025 a 04/07/2025

1.1 Projeto instalações pluviais - redimensionamento tubulação externa conforme alteração ITP (25%) = entregue 100%

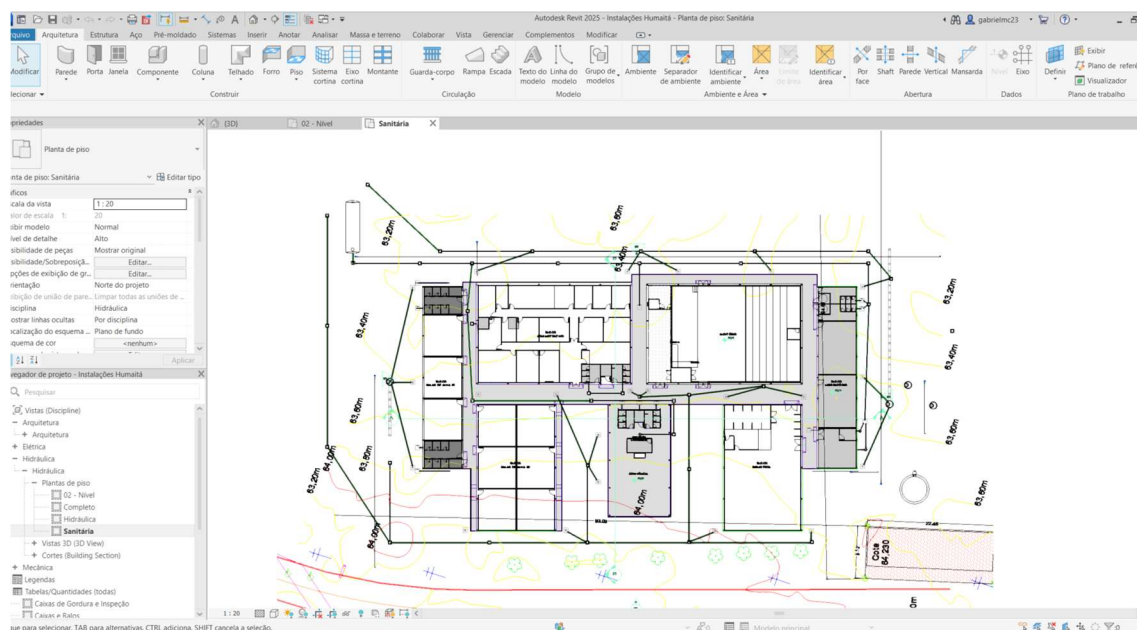

1.2 Projeto instalações pluviais - recálculo bitola tubulação externa conforme parâmetros adotados pela ITP (50%) = entregue 10%

Tubo	Vazão (L/min)	Vazão (m³/s)	Diâmetro calculado (mm)	Diâmetro adotado
1	931,32	0,01552	222,9 mm	DN250
2	1203,72	0,02006	245,3 mm	DN250
3	1546,72	0,02578	272,2 mm	DN300
4	1546,72	0,02578	272,2 mm	DN300
5	1367,44	0,02279	260,5 mm	DN300
6	683,72	0,0114	201,5 mm	DN200
7	1510,04	0,02517	269,5 mm	DN300
8	1510,04	0,02517	269,5 mm	DN300

1.3 Memória de cálculo - tubulações externas (80%) = entregue 0%

Memória Humaitá Modulares - Excel

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

O que você deseja fazer...

Recortar

Copiar

Colar

Pincel de Formatação

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

Número

Geral

Quebrar Texto Automaticamente

Mesclar e Centralizar


Formatação Condicional

D13


CONFORME PROJETO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL						
2		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO						
3		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA						
4		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS						
5		PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
6		DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA						
7								
8	Objeto: Projetos Infraestrutura Modulares Humaitá							
9	Endereço:							
10	ANEXO 05							
11	MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
12	1.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	CONFORME PROJETO				M	
14	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	CONFORME PROJETO				M	
15	CP-89450-85975693	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	CONFORME PROJETO				M	
		BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32						

2.1 Elaboração de implantação ETE Iranduba (100%) = entregue 100%

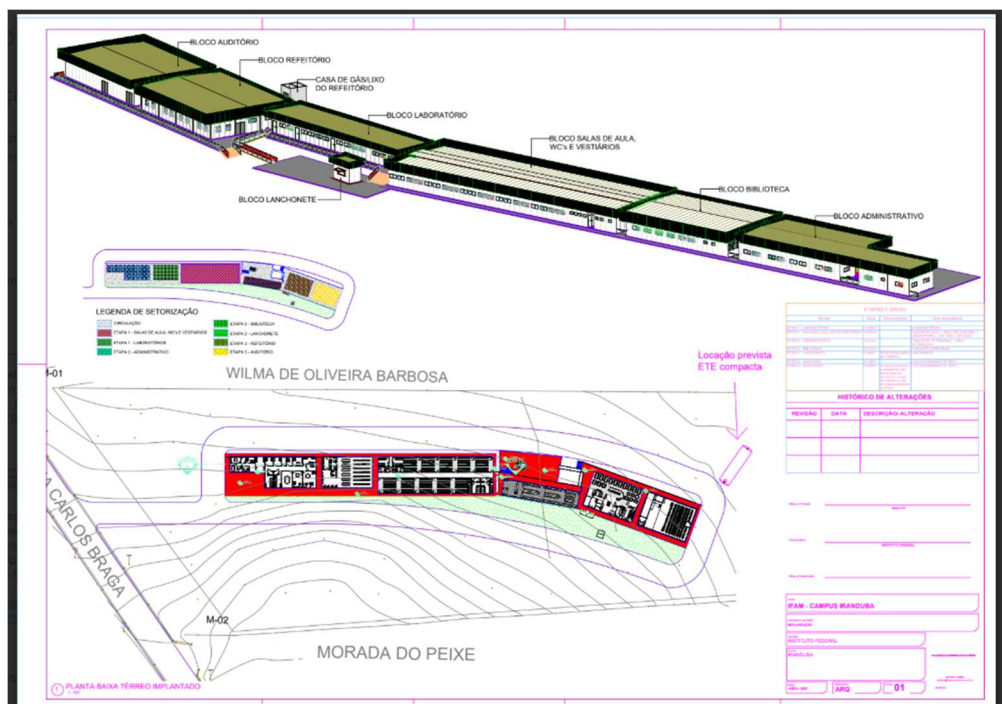

3. Refeitório Parintins - modelagem climatização Revit (100%) = entregue 100%

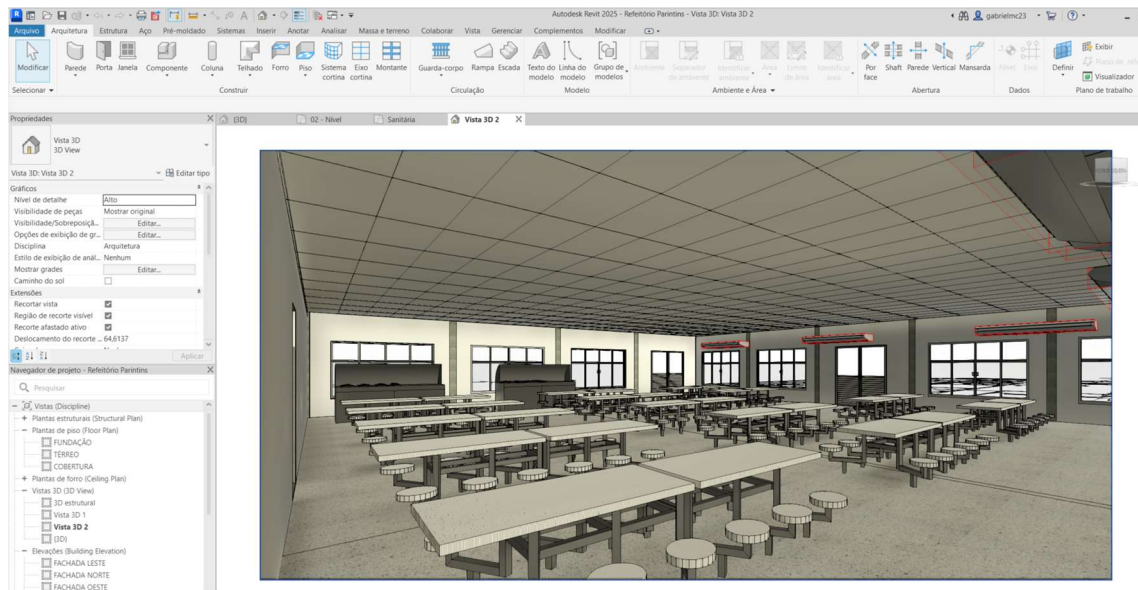

4. Campus Manacapuru - visita in loco p/ orientações técnicas p/ instalação de aquicultura = entregue 100%
