

PGD TARDE – 03/09/2025

INSERÇÃO DE ITENS NA PLANILHA DE COTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA PASTA

EXTINTORES TEL: (31) 3323-1311 END.: Rua Ouro Preto, 105 - Coroador - Manaus - AM, 69080-430 Nota: Cotação via telefone

PROTENORTE TEL: (31) 3 6000-0947 END.: Rta Cel. Ferreira de Araujo, 123 - Petropolis - Manaus - AM, 69063-000 Nota: Cotação via telefone

EXTINTORES TEL: (31) 33 143-0004 END.: Tv. Ruy Gama e Silva, 161 - Raiz, Manaus - AM, 69068-520 Nota: Cotação via telefone

CHAVE DE FLUXO CONTRA INCENDIO PARA TUBULAÇÃO 2. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CODIGO	INSUMO	EMP. 1	EMP. 2	EMP. 3	VALOR	Unidade
	CHAVE DE FLUXO CONTRA INCENDIO PARA TUBULAÇÃO 2. 1/2"	895,30	459,00	620,00	459,00	Unidade

EMPRESA 1 VENDEDOR: QUALITY TUBOS CNPJ: TEL: END: https://www.igaquamytubos.co m.br/chave-de-fluxo Nota: R\$825,40 + FRETE R\$89,90

EMPRESA 2 VENDEDOR: MERCADO LIVRE CNPJ: TEL: END: https://www.mercadolivre.com.br/chave-de-fluxo Nota: Cotação por site

EMPRESA 3 VENDEDOR: CASA DAS CORREIAS CNPJ: 04.501.136/0008-02 TEL: (92) 2121-1500 END: Av. Rondoni Prado, 4050 - Iguazu, Manaus - AM, 69077-000 Nota: Cotação via telefone

Solicitação de afastamento SIPAC (PGD e férias)

Levantamento de emboço, chapisco, pintura, alvenaria em seus devidos anexos 1 e 3

ENCUNHAMENTO			5,00	m
--------------	--	--	------	---

TERREO -CS DE BOMBA DE AGUA INCENDIO													
AMBIENTE	ESP PAREDE	PERIMETRO	ALTURA	AREA	DESCONTO ESQUADRIAS						AREA REAL	A < 6m* (SVÃOS)	A < 6m* (CVÃO S)
					JANELAS			PORTAS					
					TIPO	QNT	AREA	TIPO	QNT	AREA	D. TOTAL		
LATERAL A	0.15	2.00	2.40	4,80		-	-	PA1	1.00	1,68	1,68	3,12	3,12
LATERAL B	0.15	2.00	2.40	4,80	GR1	1,00	1,00	-	-	-	1,00	3,80	3,80
FRONTAL	0.15	2.00	2.40	4,80	-	-	-	-	-	-	-	4,80	4,80
POSTERIOR	0.15	2.00	2.40	4,80	-	-	-	-	-	-	-	4,80	4,80
TOTAL ALVENARIA 15 CM			8,00	19,20								9,60	6,92

ALVENARIA 15CM 1/2 VEZ COM A < 6M* (SEM VÃOS) =	9,60	m2
ALVENARIA 15CM 1/2 VEZ COM A < 6M* (C/ VÃOS) =	6,92	m2

ENCUNHAMENTO			8,00	m
--------------	--	--	------	---

ALVENARIA 15 CM 9X19X19 CM	16,52	m2
----------------------------	-------	----

REPÚBLICA FEDERATIVA
MINISTÉRIO DA EDUC/
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA I
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
PRO-REITORIA DE ADMINIS
DIRETORIA DE INFRAESTR

Obra: Construção e instalação modulares Campus Humaitá
Endereço: Expansão Município:Humaitá /AM – CEP: 69.800-000

ANEXO 0
CHAP


AMBIENTE	UND	VÃOS			
		A	B	C	D
FUNDOS	PERIMETRO	1,00	1,50		
	ALTURA	2,10	2,34		
	DESCONTO	-	-		
	TOTAL	2,10	3,51	-	-
TETO (LAJE LADO INTERNO)	PERIMETRO	1,00			
	COMPR	1,50			
	DESCONTO	-			
	TOTAL	1,50	-	-	-
TETO (LAJE LADO EXTERNO BEIRAL)	PERIMETRO	0,10			
	COMPR	1,50			
	DESCONTO	-			
	TOTAL	0,15	-	-	-

RESUMO CHAPISCO	TOTAL
CHAPISCO INTERNO	7,80
CHAPISCO EXTERNO SEM PRESENÇA DE VÃOS	10,21
CHAPISCO EXTERNO COM PRESENÇA DE VÃOS	-

CHAPISCO EMBOÇO, REBOCO PINT, CER RESUMO

Alteração de escalas do projeto

Alteração do tipo de telha

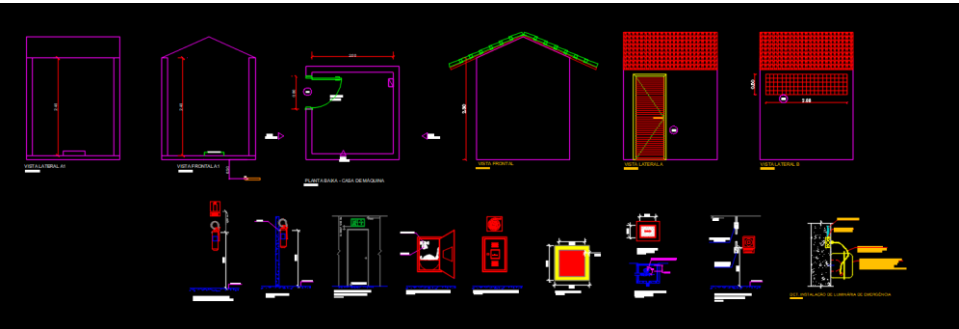

Levantamento de quantitativos revestimento, alvenaria e cobertura

7	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA)				
7.1	CASA DE MÁQUINAS				
103361	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	ANEXO 03	16,52	M2	
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO AF_03/2024	ANEXO 03	8,00	M	
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	ANEXO 01	16,52	M2	
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	ANEXO 01	11,50	M2	
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	ANEXO 01	8,82	M2	
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM AF_08/2022	ANEXO 01	8,82	M2	
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM AF_08/2022	ANEXO 01	11,50	M2	
87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS AF_03/2024	ANEXO 01	16,52	M2	
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	ANEXO 01		M2	
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_03/2024	ANEXO 01		M2	
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	ANEXO 01		M2	
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	Altura x largura = 2,10 x 0,80 = 1,68	1,68	M2	
COMP-43207813	GRADE EM PERFIL METÁLICO E TELA METÁLICA	Altura x largura = 0,50x 2,00 = 1,00	1,00	M2	
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	CONFORME PROJETO	11,56	M2	
92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	CONFORME PROJETO			
97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA AF_09/2021			M2	
104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022			KG	
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022			KG	
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022			KG	
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022			M3	
